



# Mediationsverfahren Zukunft Landwehrkanal

36. Forumssitzung am 14.5.2012



# Auslaufbauwerke Mischwasserkanalisation Carl-Herz-Ufer/ Baerwaldbrücke



## Schadensmeldung

Abbruch der Inspektion der Ausläufe am 7.2.2012 durch Taucher aufgrund Einsturzgefahr

- Uferböschung stark versackt
- Uferwand verwölbt
- Setzungen  
(Grundbruchgefahr)

## Carl-Herz-Ufer/ Baerwaldbrücke

Provisorische Stabilisierung  
der Uferwand durch das WSA  
mit Big Bags

Provisorische Sicherungs-  
maßnahmen der BWB:

- Schließung des westlichen  
Auslaufbauwerkes Mai 2012
- Vorsetzen einer Spundwand  
im Winter 2012/2013




## Carl-Herz-Ufer/ Baerwaldbrücke

Planung:

gemeinsames Auslauf-  
bauwerk für die beiden  
Regenüberlaufkanäle

geplanter Baubeginn in  
2013

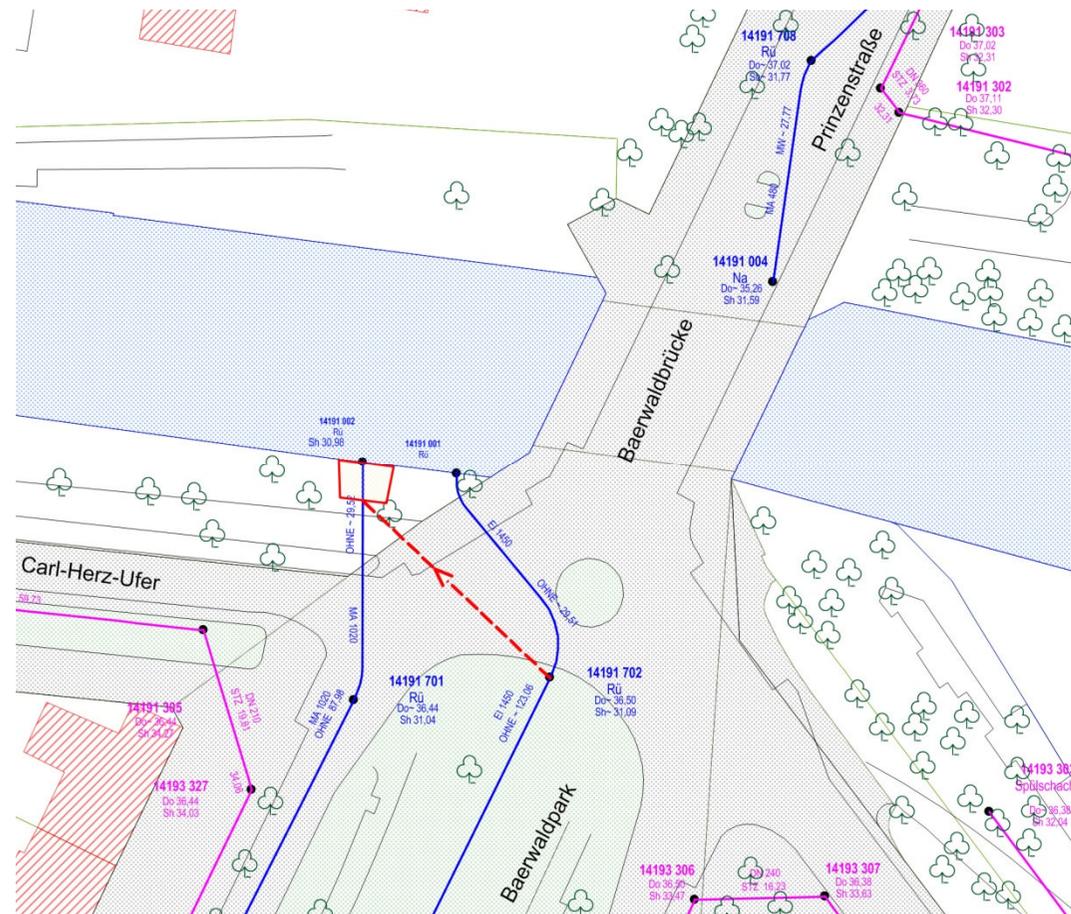

# Auslaufbauwerke Mischwasserkanalisation Landwehrkanalsteg Flotwellstr.

Planung:

Umverlegung Regen-  
überlaufkanal und  
Auslaufbauwerk im  
Zusammenhang mit  
geplantem  
Landwehrkanalsteg

geplanter Baubeginn in  
2013




# Auslaufbauwerke Mischwasserkanalisation Müller-Breslau-Str.


Planung:

Abbruch und Neubau  
Auslaufbauwerk im  
Zusammenhang mit  
Neubau Stauraumkanal  
Kantstr./ Fasanenstr.  
(Gewässergüte)

geplanter Baubeginn:  
Ende August 2012

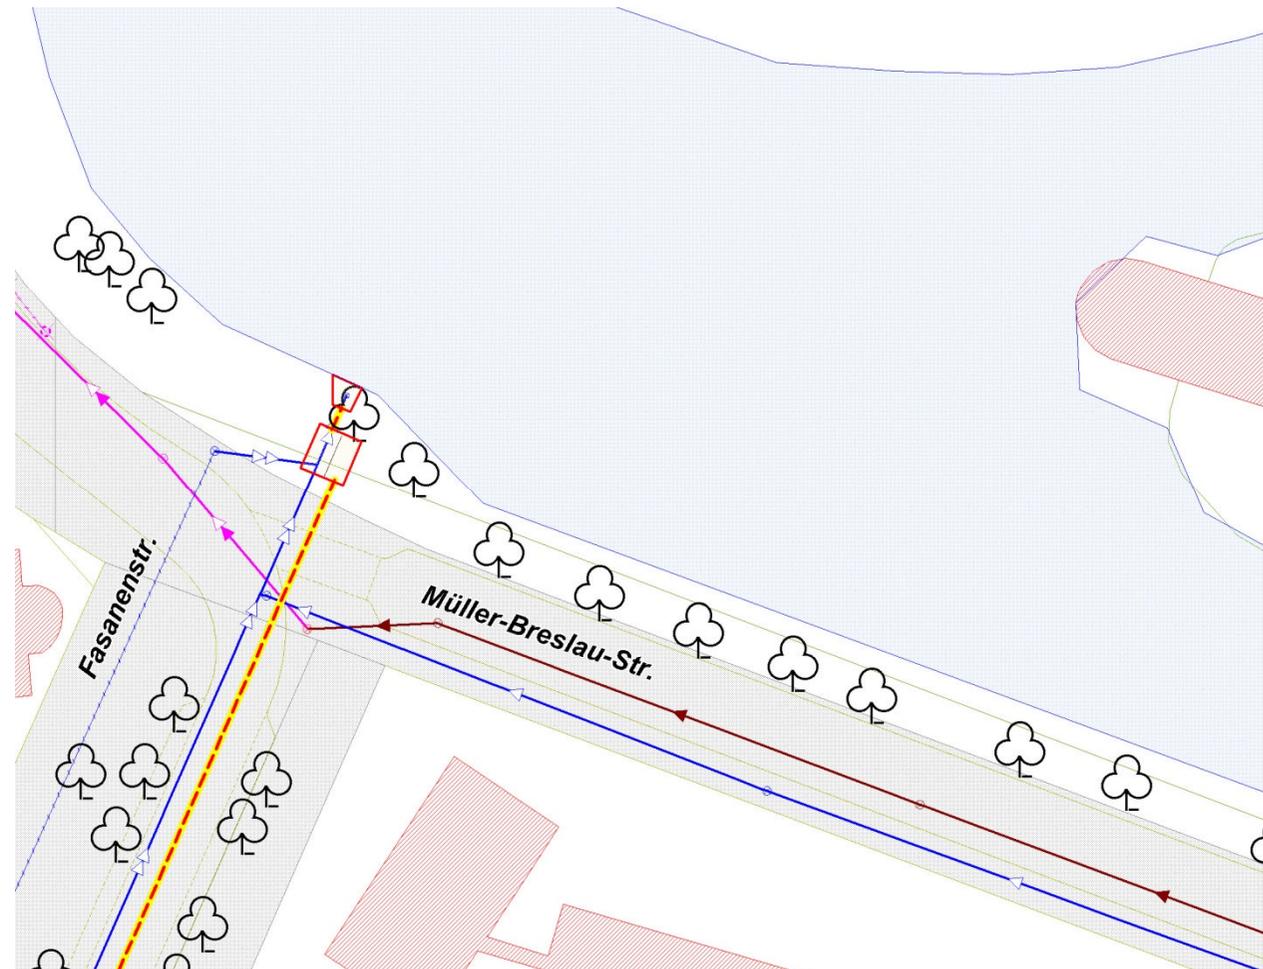

# Auslaufbauwerke Mischwasserkanalisation Müller-Breslau-Str.

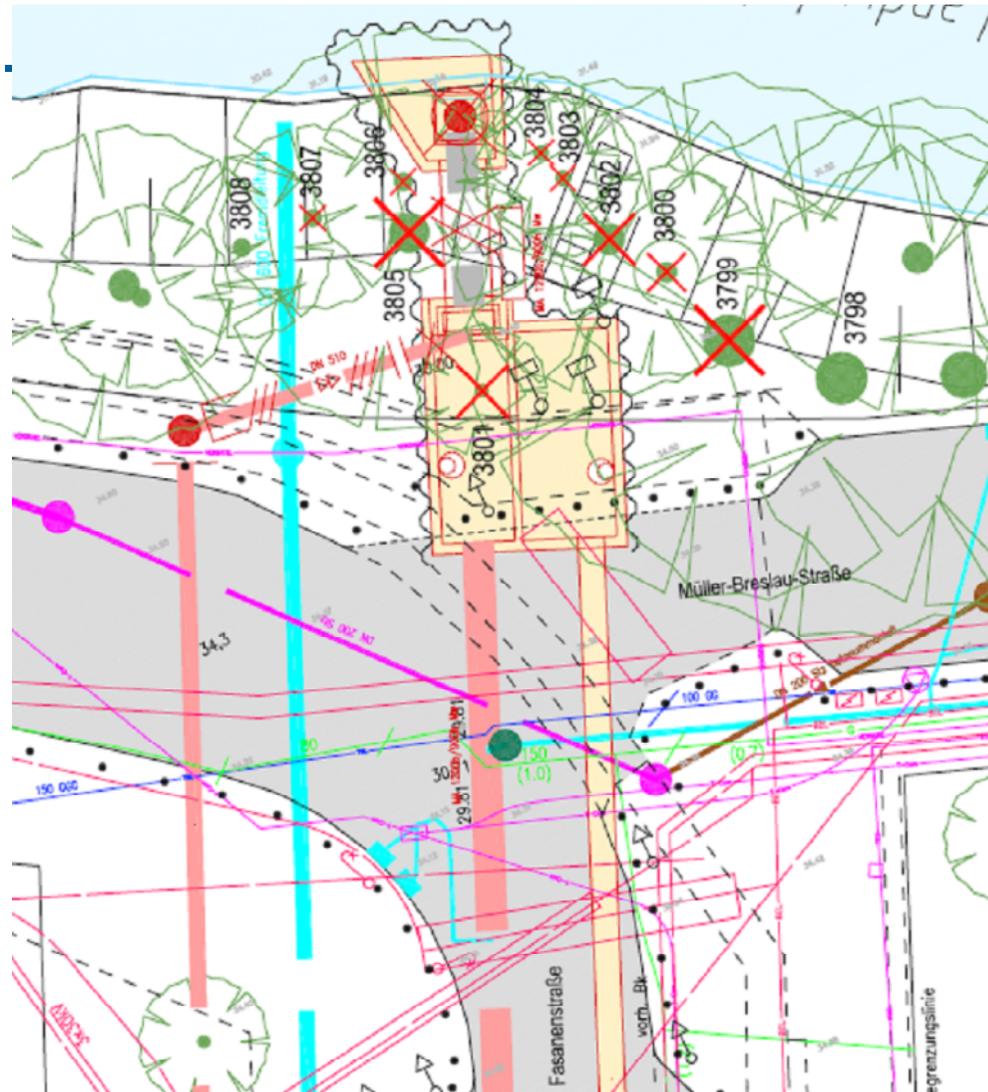


# Auslaufbauwerke Mischwasserkanalisation Lausitzer Straße

Planung:

Abbruch und Neubau  
Auslaufbauwerk im Zusam-  
menhang mit Erweiterung  
Regenüberlaufkanal von  
DN 800 auf DN 1800

geplanter Baubeginn:  
Herbst 2012

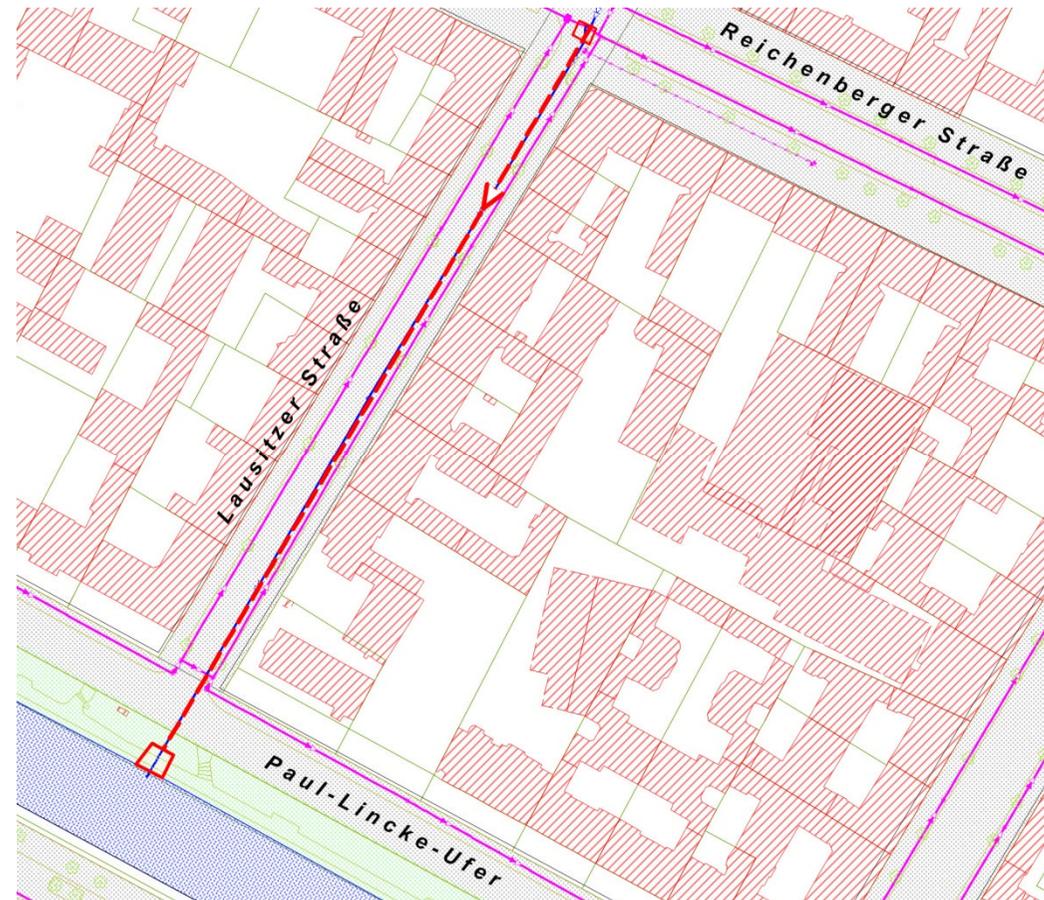

# Auslaufbauwerke Mischwasserkanalisation Lausitzer Straße

